

『154kV 서영광변전소 건설사업』


실시계획 승인신청 사업개요 및 추진현황

I 사업개요

- 사 업 명 : 154kV 서영광변전소 건설사업
- 사업목적 : 정부의 『재생에너지 3020 이행계획』 정책달성 및 영광 지역 기존 변전소(現 영광변전소) 부하 분담
- 사업위치 : 전라남도 영광군 송암면 680-1번지 일원
- 사업기간 : 2022년 4월 ~ 2026년 8월
- 총사업비 : 246억원 (변전공사 119억 / 토건공사 127억)
- 사업규모

구 분	개 요	비 고
변전소	옥내 GIS형, 변압기 154kV/23kV 15/20MVA × 3대, 2Bank(최종 4Bank), 차단기 154kV 50kA 10CCT	
사업면적	총 : 5,584.6㎡ (개폐소 : 5,548.4㎡, 진입로 : 36.2㎡)	


II 계통도

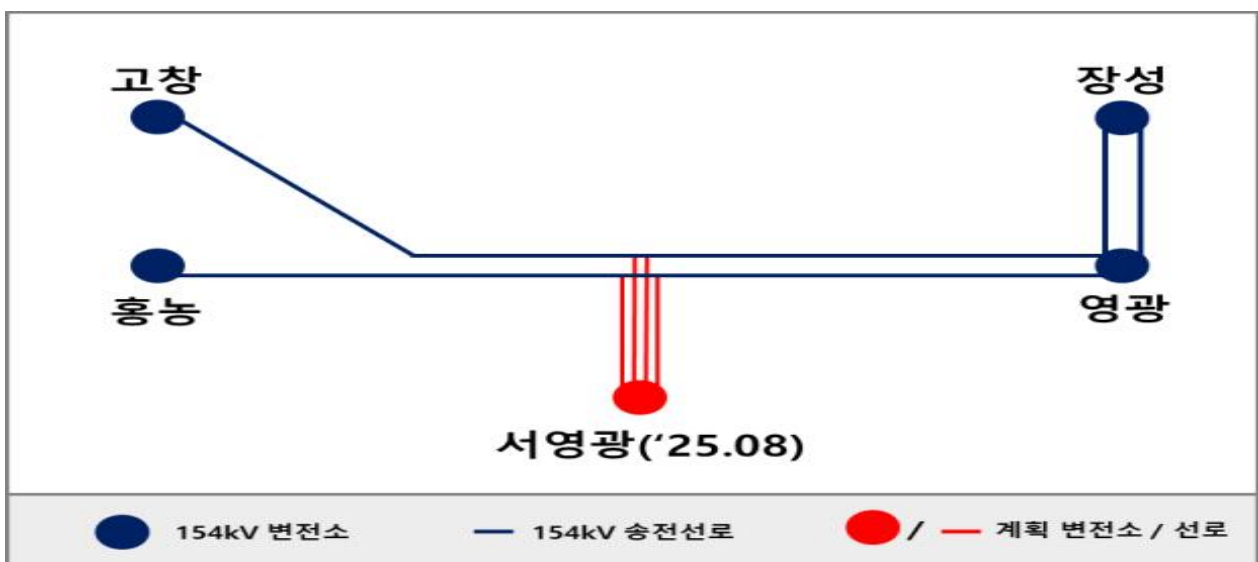

III 추진 경위

- '18.06 : 제8차 장기송변전설비계획(안) 신규반영 사업 알림
- '20.06 : 영광#2 변전소 전력영향평가 착수
- '20.07 : 사업설명회(영광군 투자경제과, 염산면장, 백수읍장)
- '20.08 : 염산면, 백수읍 이장단 및 영광군청(군수 및 의장) 사업설명회
- '20.08 ~ '21.01 : 입지선정위원회 구성 및 1차 ~ 5차 회의
- '20.12 : 입지선정위 후보지 현장답사 및 설명회
- '21.02 : 입지선정실무위원회 구성 및 시행(2개 후보지 선정)
- '21.02 : 2개 후보지 지장유무 조회(영광군, 31사단)
- '21.03 : 영광군청 설명회[2개 후보지 설명] 시행(의원 및 담당자)
- '21.03 : 사전주민설명회 시행[염산면 송암리 신대]
 - 최적 후보지 선정전 2개 후보지 마을 사전주민설명회 시행
- '21.05 : 변전소 부지 확정(입지확정위원회)
 - 확정부지 : 전라남도 영광군 염산면 송암리 680-1번지 일원
- '21.08 : 부지측량(변전소 배치) 완료
- '21.10 : 사업시행계획서 제출(→산업통상자원부)
- '22.04 : 사업시행계획 열람 및 주민설명회 개최 공고(영광군청)
- '22.04 : 주민설명회 개최(염산면 영광천일염자연학습장)
- '22.06 : 전원개발사업 실시계획 승인신청(→산업통상자원부)
- '22.04 : 전원개발사업 실시계획 승인신청에 따른 관계기관 의견조회
(산업통상자원부→관계기관)
- '22.10 : 전원개발사업 실시계획 승인신청에 따른 관계기관 의견회신
(산업통상자원부→한전)
- '23.04 : 농지전용 협의 및 농지보전부담금 납부 완료

IV 사업 추진일정



V 민원동향

☐ 현안사항 없음

붙임 1

배치도(154kV 서영광변전소 건설사업)

